

| 示识号 | 任务模式 任务名称 | 工期 开始 | 时间 完成时间 | 前置任务 资源名称 | 直接成本 |
|-----------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| _ | 情绪识别 | 23 个工作日 2020 | 年11月9日 2020年12月9日 | 1 | ¥26, 860. 00 |
| | 启动 | 3 个工作日 202 | 0年11月9日 2020年11月13 | 1日 | ¥2, 650. 00 |
| 2 | 组建核心团队 | | 0年11月9日 2020年11月9日 | 日 项目经理, U | |
| 3 | 干系人分析 | 0.5 个工作日202 | 0年11月9日 2020年11月9日 | 日 项目经理 | ¥130.00 |
| | 里程碑计划 | | 0年11月9日 2020年11月9日 | 可目经理 | ¥210.00 |
| 5 | 制定项目章程 | 1 个工作日 202 | 0年11月10日 2020年11月10 | 0日 2, 3, 4 项目经理 | ¥210.00 |
| | 项目启动大会 | 1 个工作日 202 | 0年11月11日 2020年11月11 | 1日5 项目经理,需 | i 求 [₹] ¥1,050.00 |
| 7 | 规划 | 15 个工作日 202 | 0年11月9日 2020年11月27 | 7日 | ¥5, 310. 00 |
| 8 | 规划范围 | | 0年11月12日2020年11月17 | | ¥1, 260. 00 |
| 9 | 制定需求说明书 | 1 个工作日 202 | 0年11月12日 2020年11月12 | | ¥210.00 |
| | 界面设计 | 1 个工作日 202 | 0年11月13日 2020年11月13 | | ¥210.00 |
| | 详细设计说明书 | 1 个工作日 202 | 0年11月13日 2020年11月13 | 3日9 设计专家 | ¥210.00 |
| 12 | 项目范围说明书 | | 0年11月13日 2020年11月13 | | ¥210.00 |
| 13 | ● 创建WBS | | 0年11月16日 2020年11月16 | | ¥210.00 |
| | 形成范围基准 | | 0年11月17日 2020年11月17 | | ¥210.00 |
| | 型 规划时间 | | 0年11月9日 2020年11月19 | | ¥1, 050. 00 |
| 16 | 排列工作包顺序 | | 0年11月18日 2020年11月18 | | ¥210.00 |
| | 二 估算资源 | | 0年11月19日 2020年11月19 | | ¥210.00 |
| | 估算持续时间 | | 0年11月9日 2020年11月9 | | ¥210.00 |
| 19 | 制定进度计划 | | 0年11月10日 2020年11月10 | | ¥210.00 |
| 20 | 形成进度基准 | | 0年11月11日 2020年11月11 | | ¥210.00 |
| 21 | 规划成本 | | 0年11月12日2020年11月23 | | ¥1, 110. 00 |
| | 项目成本估算 | | 0年11月12日 2020年11月12 | | ¥210.00 |
| 23 | ■ 项目预算 | | 0年11月13日 2020年11月20 | | ¥690.00 |
| 24 | 形 成范围基准 | | 0年11月23日 2020年11月23 | | ¥210.00 |
| 25 | 规划质量 | | 0年11月18日2020年11月19 | | ¥420.00 |
| 26 | 制定测试计划 | | 0年11月18日 2020年11月18 | | ¥210.00 |
| | 制定测试用例 | | 0年11月19日 2020年11月19 | | ¥210.00 |
| | 规划人力资源 | | 0年11月20日2020年11月2 | | ¥420.00 |
| | 制定人力资源计划 | | 0年11月20日 2020年11月20 | | ¥210.00 |
| | 制定人员配备管理计划 | | 0年11月23日 2020年11月23 | | ¥210.00 |
| | 型 规划沟通 规划沟通 | | 0年11月24日2020年11月24 | | ¥210. 00 |
| 32 | 制定沟通管理计划 | | 0年11月24日 2020年11月24 | | ¥210.00 |
| 33 | 规划风险 规划风险 | 4 个工作日 202 | 0年11月24日2020年11月27 | 7日 | ¥840.00 |
| | 任务 | 非活动任务 | 手动摘要总成 | 外部里程碑 | \Diamond |
| | 拆分 | 11.12 -1 H 3H 24. A | 手动摘要 | 最后期限 | • |
| 近目: 情绪识别 | | 非活动摘要 | | 正 进度 | |
| 日期: 2020年 | 12月9日 摘要 | ■ 手动任务 | ■ 仅完成时间 | 」 手动进度 | |
| | | | | | |
| | 项目摘要 『 | 仅工期 | 外部任务 | | |

| 只号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 直接成本 |
|----|------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------|
| 4 | - | 识别风险 | 1 个工作日 | 2020年11月24日 | 2020年11月24日 | 15, 21, 28 | 项目经理 | ¥210.00 |
| 55 | -5 | 风险分析 | 1 个工作日 | | 2020年11月25日 | | 项目经理 | ¥210.00 |
| 66 | - 5 | 制定风险登记册 | 1 个工作日 | | 2020年11月26日 | | 项目经理 | ¥210.00 |
| 57 | - 5 | 规划整合 | 1 个工作日 | | 2020年11月27日 | | 项目经理 | ¥210.00 |
| 8 | - 5 | 执行与监控 | 8 个工作日 | 2020年11月30日 | | | ,,,,,================================= | ¥18, 900. 00 |
| 9 | - 5 | 组建项目团队 | 1 个工作日 | | 2020年11月30日 | 7 | 项目经理,测试员 | |
| .0 | - 5 | 项目执行 | 5 个工作日 | 2020年12月1日 | | | > () () () () | ¥2, 310.00 |
| 1 | -5 | 用户模块 | 5 个工作日 | | 2020年12月7日 | | | ¥1, 470. 00 |
| 2 | -5 | 首页 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 39 | 程序员1 | ¥210.00 |
| 3 | - | 用户注册登录 | 1 个工作日 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 | 42 | 程序员1 | ¥210.00 |
| 4 | -5 | 情绪荐曲 | 1 个工作日 | 2020年12月3日 | 2020年12月3日 | 43 | 程序员1,程序员 | ¥630.00 |
| :5 | -3 | 私人日记 | 1 个工作日 | 2020年12月4日 | 2020年12月4日 | 44 | 程序员2 | ¥210.00 |
| 6 | -5 | 个人设置 | 1 个工作日 | 2020年12月7日 | | 45 | 程序员3 | ¥210.00 |
| 7 | -5 | 管理员模块 | 4 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月4日 | | | ¥840.00 |
| 8 | -5 | 用户审核 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 39 | 程序员1 | ¥210.00 |
| 9 | -5 | 会员促销活动 | 1 个工作日 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 | 48 | 程序员2 | ¥210.00 |
| 0 | -5 | 用户使用情况统计分析 | 1 个工作日 | 2020年12月3日 | | 49 | 程序员3 | ¥210.00 |
| 1 | -5 | 备份统计结果 | 1 个工作日 | 2020年12月4日 | | 50 | 程序员3 | ¥210.00 |
| 2 | -5 | 项目监控 | 3 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月3日 | | | ¥4, 410. 00 |
| 3 | -5 | 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 39 | 测试员1,项目经 | ¥630.00 |
| 4 | -3 | 监控评审 | 1 个工作日 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 | 53 | 设计专家,项目经 | ¥840.00 |
| 5 | -5 | 变更评审 | 1 个工作日 | 2020年12月3日 | 2020年12月3日 | 54 | 设计专家,项目经 | ¥840.00 |
| 6 | -5 | 例会 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | | 39 | UI专家,测试员1 | ¥2, 100.00 |
| 7 | -3 | 管理干系人 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | | | ¥630.00 |
| 8 | -5 | 发布项目信息 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 39 | 项目经理 | ¥210.00 |
| 9 | -5 | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 39 | 项目经理 | ¥210.00 |
| 0 | -5 | 干系人沟通 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | | 39 | 项目经理 | ¥210.00 |
| 1 | -5 | 团队建设 | 6 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月8日 | | | ¥6, 510. 00 |
| 2 | -5 | 培训 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 39 | UI专家,测试员1 | ¥2, 100.00 |
| 3 | - 5 | 娱乐活动 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | | 39 | UI专家,测试员1 | |
| 4 | -5 | 沟通 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | | 39 | UI专家,测试员1 | ¥2, 100.00 |
| 5 | -5 | 项目验收 | 1 个工作日 | 2020年12月8日 | | 40 | 项目经理 | ¥210.00 |
| 6 | -5 | 收尾 | 1 个工作日 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | | | ¥3, 780. 00 |
| 57 | -5 | 项目终验 | 1 个工作日 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 65 | UI专家,设计专家 | |
| | | 任务 | 非活动任务 | | 手动摘要总成 🕳 | | ■ 外部里程碑 ◇ | |
| 拆分 | | 11.14 -1 m 4m 4 | a \Diamond | 手动摘要 | | 1 最后期限 → | | |
| | | | , · | | | | | |
| | | | 非活动摘要 | | 仅开始时间 [| | 进度 | |
| | | 摘要 | 1 手动任务 | | 仅完成时间] | | 手动进度 | |
| | | 项目摘要 『 | 1 仅工期 | | 外部任务 | | | |
| | | | | | | | | |

| 示识号 | 任务模式 | 任务名称 | | 工 | 期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 直接成本 |
|-----------|------------|------|------------|------|--------------|------------|-------------------------|------|--|-------------|
| 68 | - 5 | | 使用最新采集的数据集 | 预测表1 | 个工作日 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 65 | 程序员1,程序员 | ¥630.00 |
| | -5 | | 项目内部收尾 | 1 | 个工作日 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 65 | 程序员1,程序员 | ¥2, 100. 00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 任务 拆分 | | 非活动任务 非活动里程碑 | I ◇ | 手动摘要总成 一 手动摘要 | | ■ 外部里程碑¶ 最后期限 | |
| 项目:情绪识 | | | 里程碑 ◆ | | 非活动摘要 | | 仅开始时间 [| | 进度 | · |
| 日期: 2020年 | 三12月9日 | | 摘要 | | 手动任务 | | 仅完成时间] | | 手动进度 - | |
| | | | 项目摘要 『 | | 仅工期 | | 外部任务 ■ | | | |

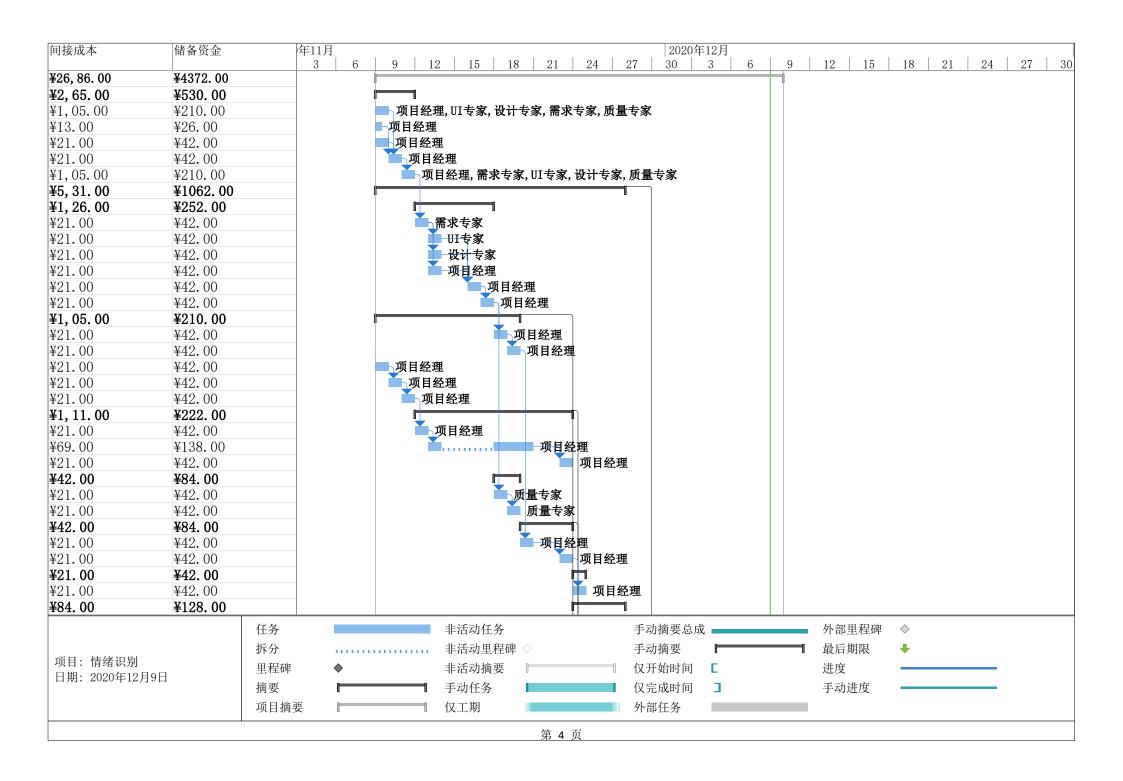

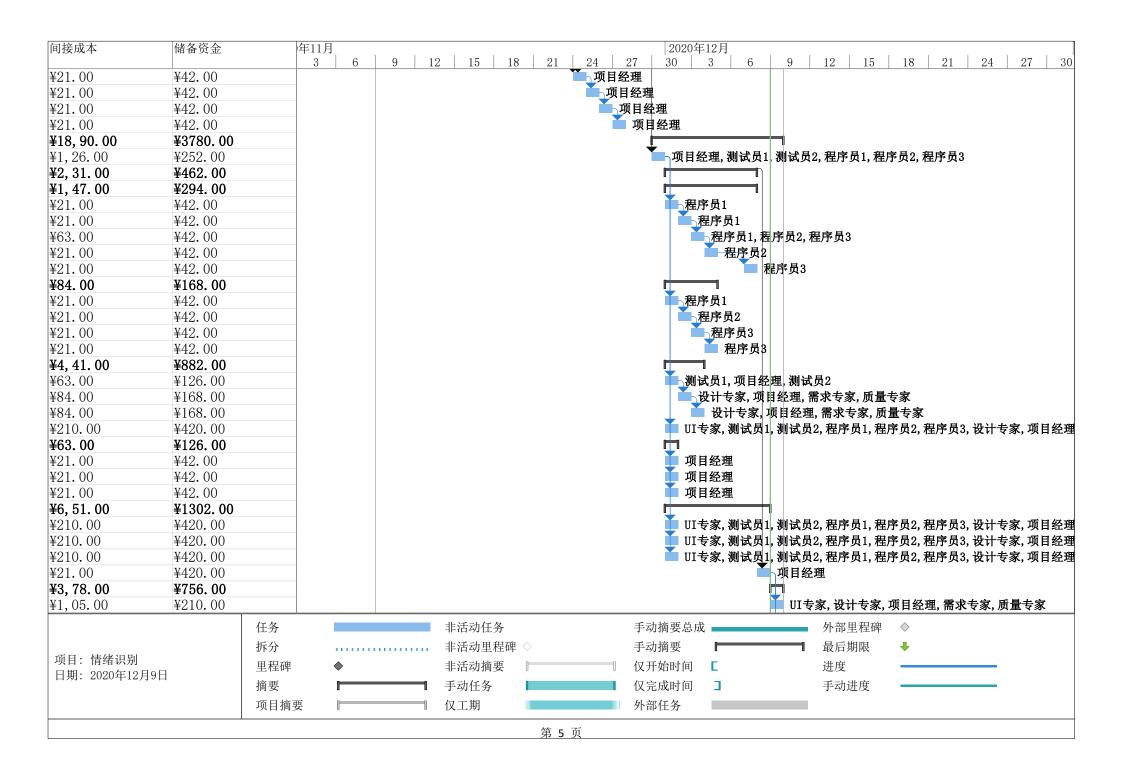

| 间接成本 | 储备资金 | 年11月 | 6 9 1: | 2 15 18 | 3 21 24 | 2020年 27 30 | 3 6 | 9 | 19 15 | 18 21 | 24 27 3 |
|-----------------|---------|------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----|----|-----------|--------------------------|--------------|
| ¥63 . 00 | ¥126.00 | 3 | 6 9 1 | 2 15 16 | 5 21 24 | 21 30 | 3 0 | | | 10 21 程序员3 | 24 21 3 |
| ¥210.00 | ¥420.00 | | | | | | | 程序 | 5月1,程序员2, | 程序员3,项目经 | 型, UI专家, 测试员 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 任务 | | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 | | | 外部里程碑 | \Diamond | |
| | 拆分 | | | 非活动里程碑 | | 手动摘要 | | 1 | 最后期限 | • | |
| 页目: 情绪识别 | 田程 | | > | 非活动摘要 | | | Е | | 进度 | | |
| 日期: 2020年12月9日 | 摘要 | | | 手动任务 | | 仅完成时间 | 3 | | 手动进度 | | |
| | 项目 | | | 仅工期 | | 外部任务 | | | | | |
| | | | | · · | 第 6 页 | | | | | | |

